



ROYAUME DU MAROC  
MINISTRE DE L'INTERIEUR  
REGION BENI MELLAL – KHENIFRA  
AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS

# PROGRAMMES EAU EXECUTES PAR L'AREP

**« AZILAL »**

**LE 10/05/2023**

# SOMMAIRE

Lacs collinaires

PNAEPI

❖ Etudes

❖ Travaux

20MDH

40MDH

PRDS

Programme Normal

**CONVENTION SPECIFIQUE DE PARTENARIAT, DE FINANCEMENT ET DE  
REALISATION DES PETITS BARRAGES ET LACS COLLINAIRES AU  
NIVEAU DE LA REGION DE BENI MELLAL – KHENIFRA**

**PROVINCE D'AZILAL**

**Mai 2023**

## BARRAGES PROGRAMMÉS DANS LA PROVINCE D'AZILAL

Province	Bassin Hydraulique	Nom du barrage	Localisation (Commune)	Capacité de stockage en m <sup>3</sup>	Usage	Nature de l'intervention	Programmation	Coût estimé (MDH)
Azilal	Oum Rbiaa	Talat Nouareb	Tanant	3 120 000	IRR	Réalisation	2023	33,8
Azilal	Oum Rbiaa	Sidi Ali Ben Brahim	Bni Ayatt	400 000	IRR + PCI + Ab. Cheptel + RN	Réalisation	2024	19,8

## ÉTAT D'AVANCEMENT DES ÉTUDES

A TITRE D'INFORMATION : MISSIONS FORMANT L'ÉTUDE POUR UN DÉLAI COMPRESSÉ DE 4 À 6 MOIS SONT COMME SUIT :

- MISSION I : ÉTABLISSEMENT DES ÉLÉMENTS DE CONCEPTION (ANALYSE CRITIQUE DES ÉTUDES ANTÉRIEURES, ÉTUDE HYDROLOGIQUE, ÉTUDE TOPOGRAPHIQUE, ÉTUDE GÉOLOGIE-GÉOTECHNIQUE)
- MISSION II : ÉTUDE D'AVANT-PROJET DÉTAILLÉ (APD)
- MISSION III : ÉTABLISSEMENT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

## ÉTAT D'AVANCEMENT DES ÉTUDES ET PRÉVISION DE LANCEMENT DES TRAVAUX

LES BARRAGES PROGRAMMÉS DANS LA CONVENTION AU NIVEAU DE LA PROVINCE D'AZILAL SONT EN COURS D'ÉTUDES PAR L'AREP À DES PHASES DIFFÉRENTES :

Nom du barrage	Capacité de stockage en m3	Année prévisionnelle	Coût en (MDH)	Nature de l'intervention	Etat d'avancement du projet	Date prévisionnelle
Talat Nouareb (Tanant)	3.120.000	2023	33,8	Etudes & Travaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etude en cours par BET GCIM (reconnaissance des lieux fait le 07/02/2023)</li> <li>- Mission I provisoire remise et examinée</li> <li>- Mission I définitive en cours d'exécution</li> <li>- Marché d'expropriation en cours de lancement</li> </ul>	DCE prévu le 15/07/2023
Sid Ali Ben Brahim (Bni Ayatt)	400.000	2024	19,8	Etudes & Travaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etude en cours par BET GCIM (reconnaissance des lieux fait le 08/02/2023)</li> <li>- Mission I provisoire remise et examinée</li> <li>- Mission I définitive en cours d'exécution</li> <li>- Marché d'expropriation en cours de lancement</li> </ul>	DCE prévu le 15/09/2023
<b>TOTAL</b>	<b>3 520 000</b>		<b>53,6</b>			

## CONSISTANCE DES PRESTATIONS D'EXPROPRIATION

L'étude parcellaire consiste en :

- La délimitation des zones d'expropriation ;
- La reconnaissance et établissement des plans et états parcellaires ;
- Le traitement des réclamations.

## DÉLAI D'EXÉCUTION

Le délai global de l'exécution de l'étude parcellaire est de deux mois (2 mois), réparti comme suit :

**Délai de la délimitation des zones d'expropriation, reconnaissance et établissement des plans et états parcellaires :**

Ce délai est fixé à 1 mois, il est réparti comme suit :

**Délai de traitement des réclamations :**


Ce délai est fixé à 1 mois.

## PROGRAMME PRÉVISIONNEL COMPRESSE DE RÉALISATION DES BARRAGES - AZILAL


DESIGNATION	DELAI CONTRACTUEL D'ACHEVEMENT DES ETUDES	DATE CONVENUE REMISE DCE	PREPARATION DU MARCHÉ DES TRAVAUX ET DAO	DATE PRÉVISIONNELLE DE DEMARRAGE DES TRAVAUX	DELAI ESTIMÉ DES TRAVAUX	DATE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX	PARCELLAIRE
BARRAGE TLAT NOUAREB	6 mois* (+3 mois)	15/07/2023	1 mois 15j	01/10/2023	12 mois	Oct. 2024	- Appel d'Offres en cours de publication.  - Délai : 3 mois
BARRAGE SIDI ALI BEN BRAHIM	6 mois* (+3 mois)	15/09/2023	1 mois 15j	01/11/2023	14 mois	fin 2024	- Etude parcellaire sera disponible : Oc. 2023

\* Sans tenir compte du délai d'examen par le Maître d'Ouvrage et les délais nécessaires à l'exécution des reconnaissances géologiques et essais géotechniques qui peuvent atteindre 2 à 3 mois.

# PLAN DE SITUATION DU BARRAGE TALAT NOUAREB

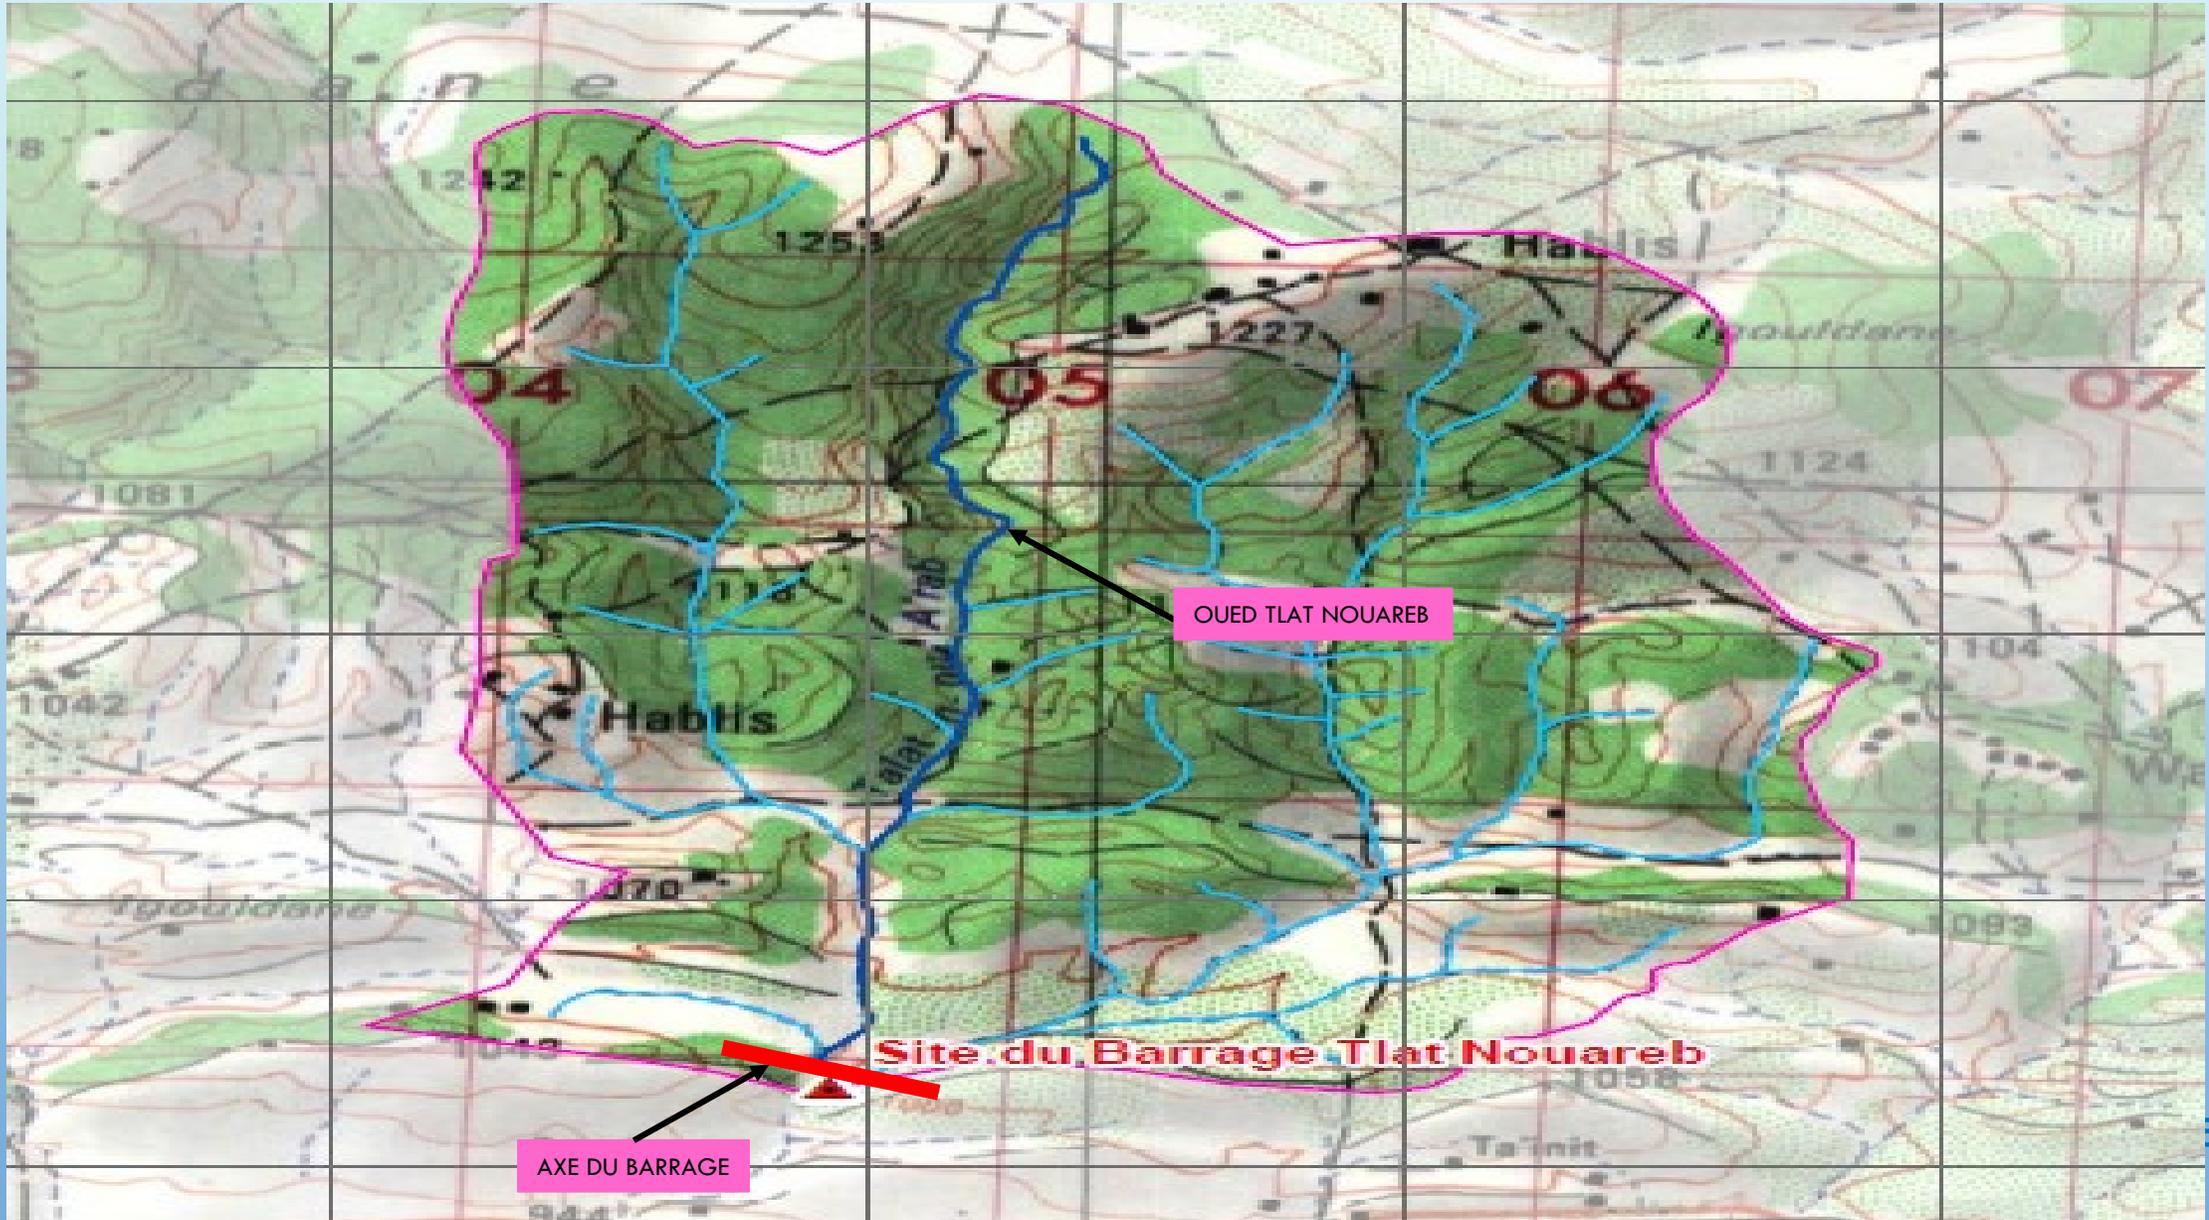


## ZONE À EXPROPRIER DU BARRAGE TALAT NOUAREB

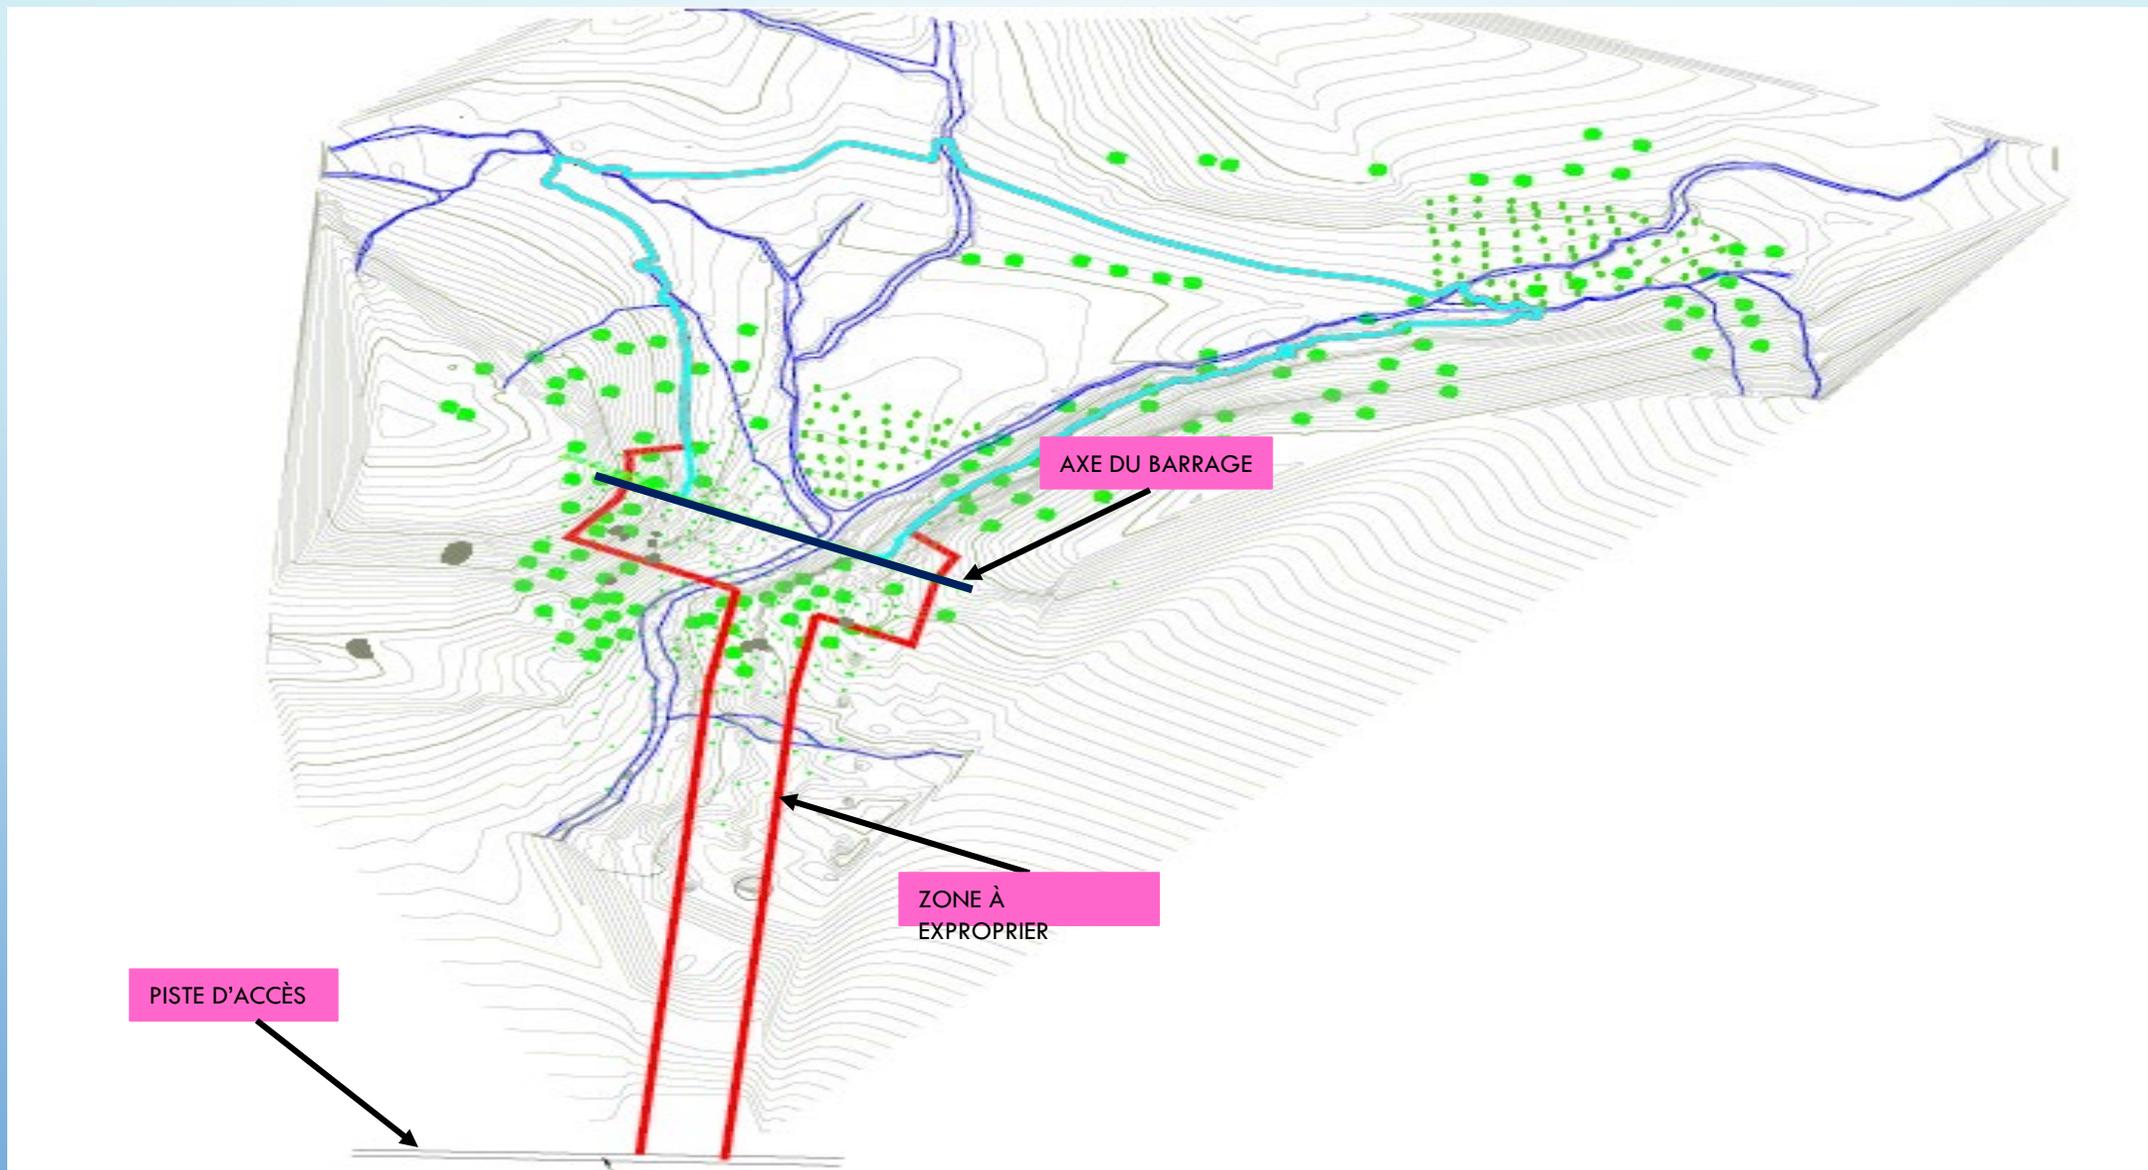


**AIRE DE LA ZONE À EXPROPRIER ESTIMÉE À 16 HA**

# PLAN DE SITUATION DU BARRAGE SIDI ALI BEN BRAHIM

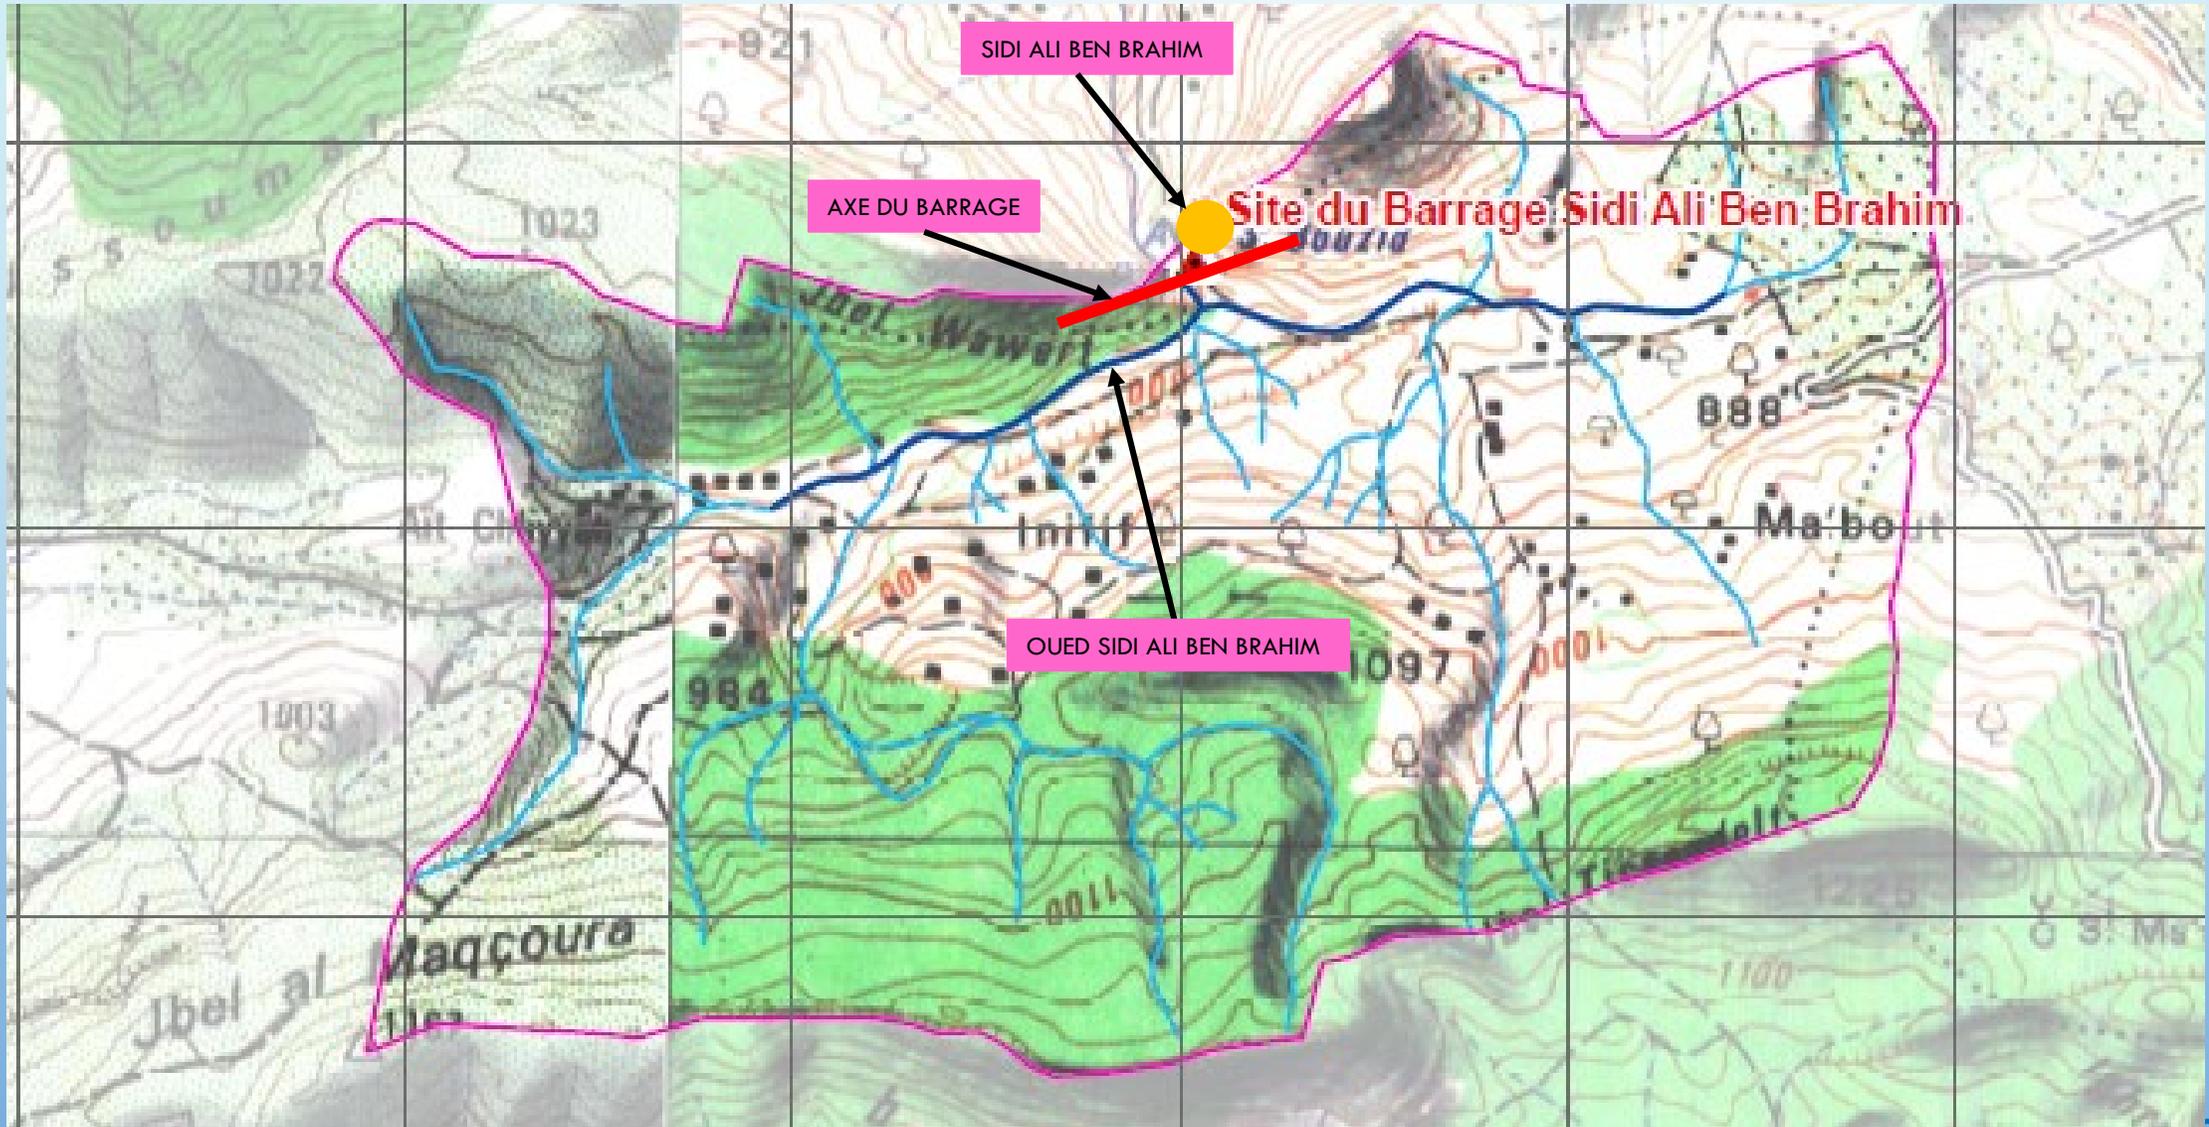

# ZONE À EXPROPRIER DU BARRAGE SIDI ALI BEN BRAHIM

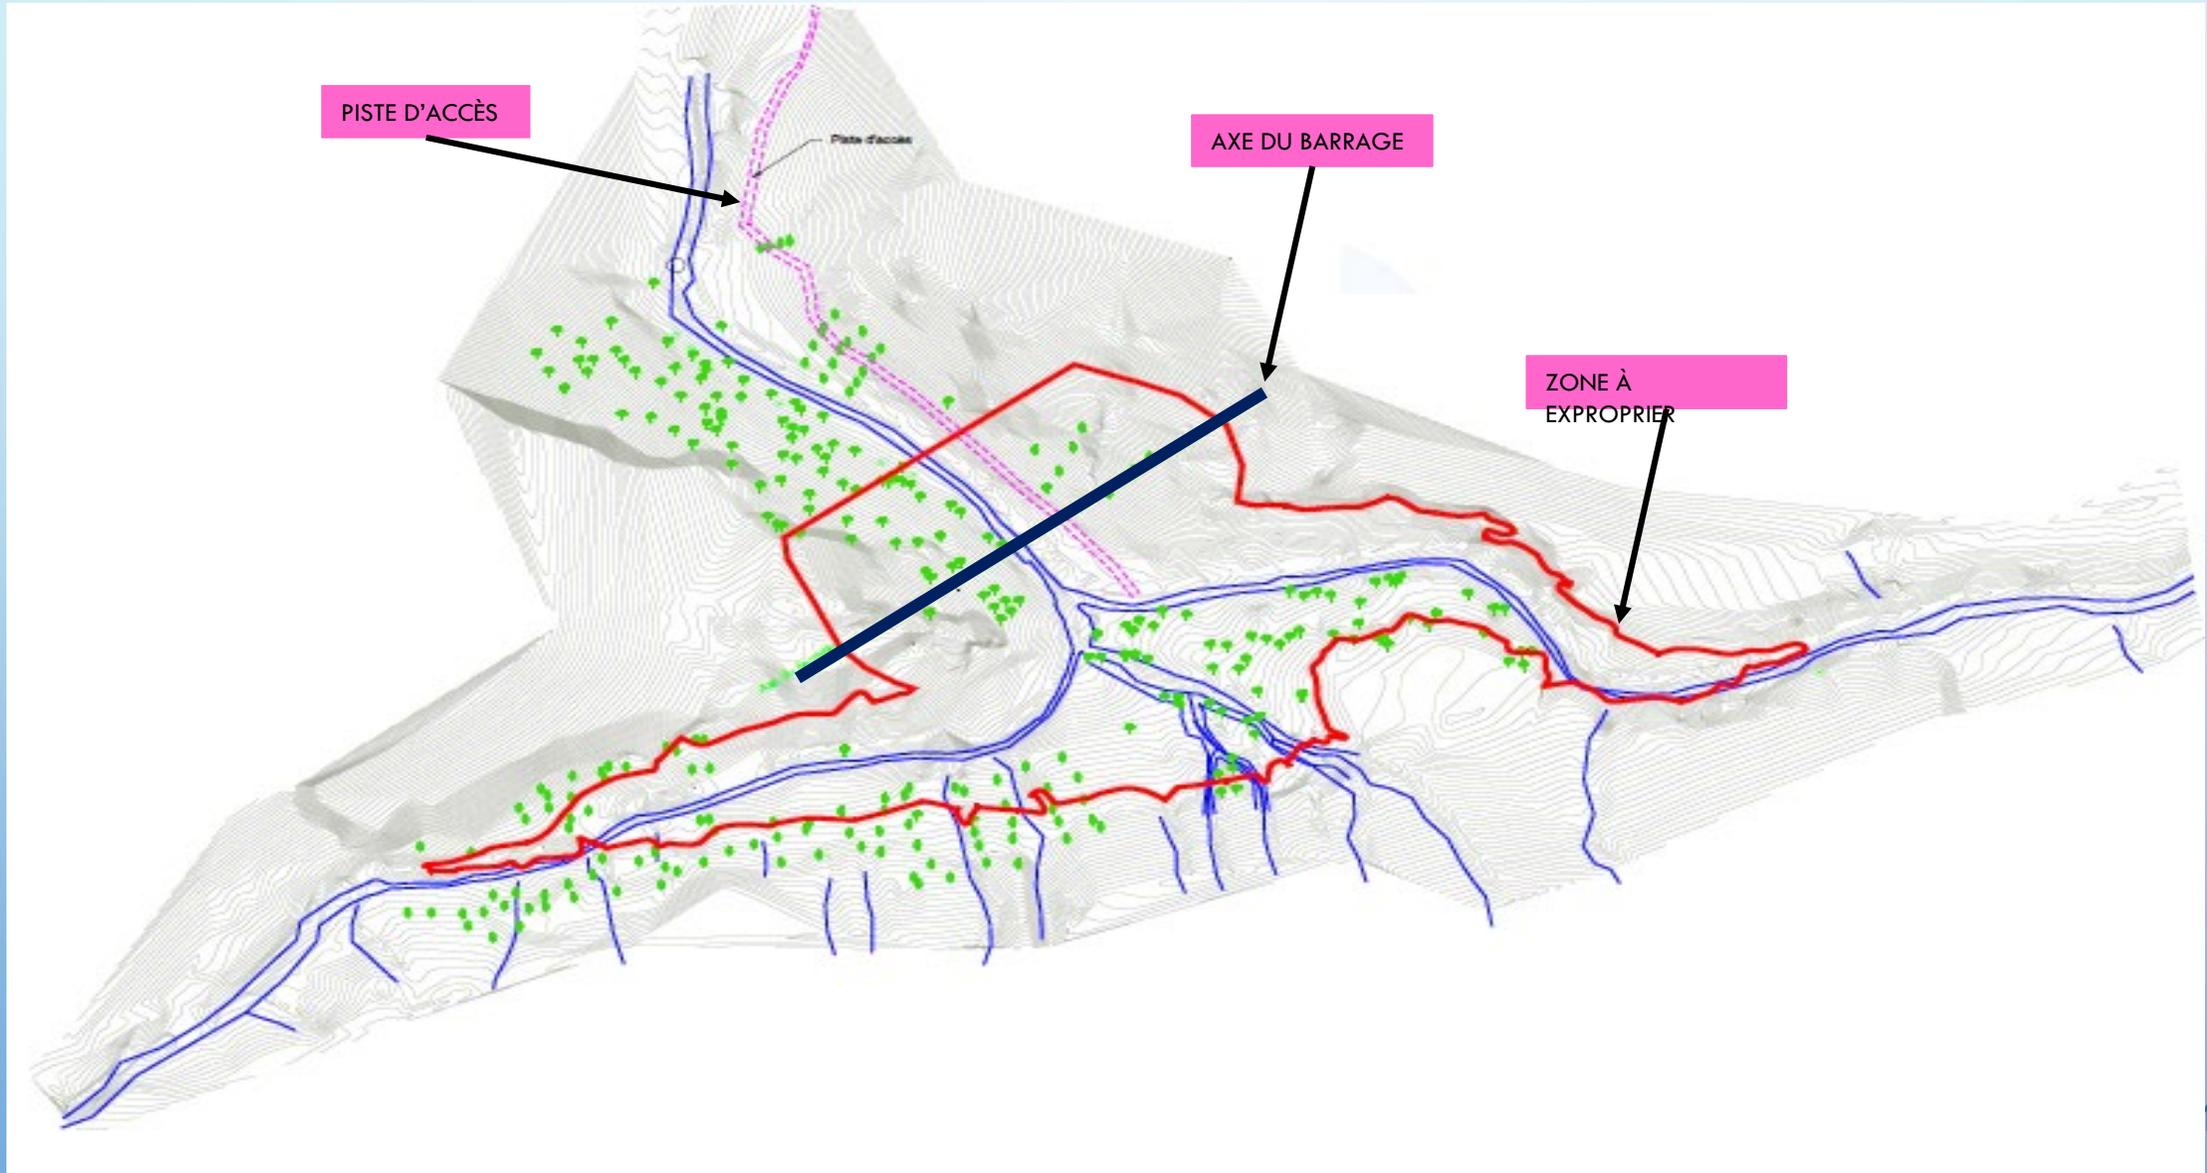

**AIRE DE LA ZONE À EXPROPRIER ESTIMÉE À 9 HA**



## CONCLUSION

Il est souhaitable de désigner une commission Provinciale pour appuyer l'exécution des projets dans le volet expropriation et mise à disposition des terrains pour les travaux. Chaque projet compte trois (03) zones à exproprier : la retenue, l'accès au site du barrage et déviation des pistes existantes et la zone des travaux. Pour les deux barrages programmés durant l'année 2023, la surface à exproprier s'élève à environ **25 ha**.

# PNAEPI-PROVINCE D'AZILAL

<u>Commune</u>	<u>Douars/Centres</u>	<u>Type de réseau</u>	<u>Consistance</u>	<u>Année</u>	<u>Coût estimé en (MDH)</u>	<u>Etudes</u>	<u>Avancement</u>	<u>Observation</u>
OUAOULA	Timnsourine, lkabline, Addammar	bornes-fontaines	Equipement, réservoir et réseau	2022	1,29	Province	Commencement imminent	- Bureau d'études chargé de suivi désigné
Tabaroucht	Mliane, Ait Aissa, Ait Idir, Tibouhsinine, Tagnariout, Ouasskimout, Chitou, Tirzit	bornes-fontaines	Equipement forage, réservoir et réseau	2022	3,86	Province	Avancement des travaux :10%	- Travaux en cours - Bureau d'études chargé de suivi désigné
Ait Ouqabli	Ait Ouqabli	branchement individuel	Réservoir, station de pompage, réseau, branchements	2022	5	ONEEP	Démarrage des travaux 30/05/2023	- Marché de travaux en cours d'approbation/visa - Bureau d'études chargé de suivi désigné
Tanant -Foum Jemaa-Bni Hssan-Bzou	Tanant( 2ème Tranche) -Foum Jemaa-Bni Hssan-Bzou	branchement individuel	production	2023	56,7	Etudes à actualiser disponible chez ONEEP	- Lancement du marché travaux 01/06/2023	Actualisation des études en cours
Tabia	Divers douars	bornes-fontaines	Réseau , réservoirs	2023	14	Etudes à actualiser disponible chez ONEEP	- Lancement du marché travaux 01/07/2023	Actualisation des études en cours

Commune	Douar/Centre	Type de réseau	Consistance	Année	Coût	Etudes	Avancement	Observation
					estimé en (MDH)			
Tagleft	Tagleft	branchement individuel	Besoin à déterminer une fois le BET désigné	2023	20	Etudes à actualiser disponible chez ONEEP	- Lancement du marché travaux 01/07/2023	Actualisation des études en cours
	Aftiss	bornes-fontaines		2023	1,2	AREP	- Lancement du marché travaux 20/06/2023	Etudes en cours
Tiffert N'Ait Hamza	Tifirt N'Ait Hamza	branchement individuel		2023	15	Etudes à actualiser disponible chez ONEEP	- Lancement du marché travaux 01/08/2023	En attente de recevoir les études faits par l'ONEEP
Ait Boulli	Douars de la commune	bornes-fontaines		2023	3	AREP	- Lancement du marché travaux 01/08/2023	Etudes en cours
ZAOUÏAT AHANSAL	Aknaryou	bornes-fontaines		2023	1	AREP	- Lancement du marché travaux 01/08/2023	Etudes en cours
Tamda Noumercid	Amercid	branchement individuel		2023	3,6	AREP	- Lancement du marché travaux 20/07/2023	Etudes en cours
	Tamgante	bornes-fontaines		2024	0,7	AREP	- Lancement du marché travaux 05/08/2023	Etudes en cours

<u>Commune</u>	<u>Douars/Ce ntres</u>	<u>Type de réseau</u>	<u>Consistance</u>	<u>Ann ée</u>	<u>Coût estimé en (MDH)</u>	<u>Etudes</u>	<u>Avancement</u>	<u>Observation</u>
Ait Majden	Galzamt, Ait Faska, Amougz	bornes- fontaines	Besoin à déterminer une fois le BET désigné	202 4	3,1	AREP	- Lancement du marché travaux 20/08/2023	Etudes en cours
Sidi Yaakoub	ighram	bornes- fontaines		202 4	1	AREP	- Lancement du marché travaux 20/08/2023	Etudes en cours
Ait Tamlil	Tamrite et iminkn ait hadou	bornes- fontaines		202 4	1	AREP	- Lancement du marché travaux 20/08/2023	Etudes en cours
Tanant	Ait wirar	bornes- fontaines		202 4	1	AREP	- Lancement du marché travaux 20/08/2023	Etudes en cours
Bni Hassan	Zaouit Sidi Abdlhak	bornes- fontaines		202 4	0,5	AREP	- Lancement du marché travaux 05/08/2023	Etudes en cours
Ouiaouizer th	lhitassne	bornes- fontaines		202 4	0,7	AREP	- Lancement du marché travaux 20/08/2023	Etudes en cours

Commune	Douars/Centres	Type de réseau	Consistance	Année	Coût	Etudes	Avancement	Observation
					estimé en (MDH)			
Tifni	Imintizgui	bornes-fontaines	Besoin à déterminer une fois le BET désigné	2024	1	AREP	- Lancement du marché travaux 20/07/2023	Etudes en cours
Ait M'hamed	Agred ait bohouch	bornes-fontaines	Réservoir	2024	0,5	AREP	- Lancement du marché travaux 20/07/2023	Etudes en cours
Sidi Boukhlef	Ait Baadi-Islak	bornes-fontaines	Besoin à déterminer une fois le BET désigné	2024	1,5	AREP	- Lancement du marché travaux 20/08/2023	Etudes en cours
Taounza	Ait Touhmane, Aghbalo ait toutss, Ait Ali Oyoussf	bornes-fontaines	Besoin à déterminer une fois le BET désigné	2024	1,81	Etudes à actualiser disponible chez ONEEP	- Lancement du marché travaux 01/08/2023	Actualisation des études en cours
Tiloughite	Ait Ali Ouaabdelah	bornes-fontaines	Besoin à déterminer une fois le BET désigné	2024	1	AREP	- Lancement du marché travaux 20/08/2023	Etudes en cours
Moulay Aissa Ben Driss	Ataachach	bornes-fontaines	Besoin à déterminer une fois le BET désigné	2024	0,8	AREP	- Lancement du marché travaux 20/08/2023	Etudes en cours
Rfala	Douars de la commune	bornes-fontaines	extension du reseau	2024	1,8	AREP	- Lancement du marché travaux 20/08/2023	Etudes en cours
<b>TOTAL AZILAL</b>					<b>141,06</b>			

# 20 MDH

N° de marché	Objet	Montant	Avancement Physique	Observations
<b>Province d'AZILAL</b>				
<b>Programme 20 MDH</b>				
137/2022	TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE L AUTONOMIE DE STOCKAGE D EAU POTABLE DU CENTRE D AIT OUKABLI PROVINCE D AZILAL LOT UNIQUE	1.800.330,00	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Local technique 80%</li> <li>• Mur de clôture 80%</li> <li>• Station de reprise 30%</li> <li>• Pose d'acier Pour R250 en cours</li> </ul>
112/2022	TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DES DOUARS IKISS IROUHANE ET TAGHJOURTE RELEVANT CT SIDI BOULKHLEF PROVINCE D'AZILAL –LOT UNIQUE	1.343.316,00	50%	Reste reservoirs et plaques solaires
96-2022	TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DES DOUARS RELEVANT CT TIFNI ET CT TANANT PROVINCE D'AZILAL -LOT UNIQUE	2.042.649,60	90%	Réservoirs et regards en cours de finition
107-2022	TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES DOUARS TAMAJOUTE, AIT HSAINE ET ASKAR A LA CT TAGLEFT-PROVINCE AZILAL-LOT UNIQUE	1.272.480,00	100%	Travaux Achevés
94/2022	TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'AEP DU DOUAR TALAT A LA CT AFOURAR, PROVINCE D'AZILAL-LOT UNIQUE	427.920,00	100%	Travaux Achevés
109-2022	TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU RESEAU D'AEP DES DOUARS ISSOUKA LABLANE, TAOURIRT LABLANE ET BOUSKOUR LABLANE RELEVANT DE LA COMMUNE TERRITORIALE DE BENI AYAT- PROVINCE D'AZILAL -EN LOT UNIQUE	1.396.236,00	80%	Reste les compteurs
110/2022	TRAVAUX De RÉALISATION DES FORAGES (RECONNAISSANCE Et D'EXPLOITATION ) AUX DIFFERENTES COMMUNES DE LA REGION BENI MELLAL ET KHENIFRA ( LOT KHOURIBGA ET AZILAL)	768.700,00	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 er forage achevé</li> <li>• 2 -ème forage problème d'accès</li> </ul>
123-2022	TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DES DOUARS RELEVANT DE LA CT AIT MHAMED PROVINCE D'AZILAL-LOT UNIQUE	3.768.000,00	30%	Travaux de terrassement et pose de la conduite en cours
91/2022	ACQUISITION D'UN CAMION CITERNE DE 10 M3 ET 8 CAMIONS CITERNES DE 6 M3 AU PROFIT DE LA REGION BENI MELLAL KHENIFRA	5.910.356,40	100%	Achevé
		<b>18.729.988,00</b>		

# 40 MDH / PROJETS AEP

<u>N° de marché</u>	<u>Objet</u>	<u>Montant</u>	<u>Avancement Physique</u>	<u>Observations</u>
<b>Province d'AZILAL</b>				
<b>Programme 40 MDH</b>				
138/2022	TRAVAUX D ADDUCTION EN EAU POTABLE DES DOUARS : CENTRE ANERGUI, AGUARD NOUAJA BATLI ET ASKMOUD CT ANERGUI PROVINCE D AZILAL	1.246.800,00	100%	Travaux Achevé
139/2022	TRAVAUX D ADDUCTION EN EAU POTABLE DU DOUAR IGHIL NOUMARRAD A LA CT TAMDA NOUMARCID PROVINCE D AZILAL - TRAVAUX D ADDUCTION EN EAU POTABLE DU DOUARS AIT AAMER ET AIT AISSA A LA CT OUAOULA PROVINCE AZILAL	1.027.620,00	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux Achevé reste finition</li> <li>• Besoin de 2400 m de conduite PEHD de diamètre 40 mm(CT OUAOULA)</li> </ul>
136/2022	TRAVAUX D ADDUCTION EN EAU POTABLE DES DOUARS IZLOULENE TIMZITE ET ASSAMER IRIKITENE CT AIT OUMDISS TRAVAUX D ADDUCTION EN EAU POTABLE DES DOUARS AIT OUYOURE ET AIT OUAHMANE CT SIDI YAAKOUB PROVINCE AZILAL	1.261.080,00	100%	Travaux Achevé
53/2023	TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DES DOUARS TAABDITE IGHAM N'AIT ALASRI, TALMODAAT ET TIZIRITE A LA C.T AGOUDI N'LKEIR, PROVINCE D'AZILAL 2-TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DES DOUARS AIT SRI LABLANE, AIT SRI BOUAADIA ET AIT SRI A LA CT TIMOULILTE, PROVINCE D'AZILAL LOT UNIQUE	1.482.960,00	-	Commencement Imminent
<b>TOTAL ZILAL</b>		5.075.460,00		

# PRDS

Province d'Azilal					
2020	177/22	Travaux d'AEP du douar Tifouina relevant de la commune Zaouiat Ahnsal	1.249.652,40	25%	Travaux de conduites achevés, reste GC
2021	19/2023	TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES DOUARS RELEVANT DES COMMUNES TERRITORIALES AGOUDI N'LKHEIR, TAGLEFT, ANERGUI ET TANANT	1.612.611,24	5%	Terrassement en cours
2022	50/2023	AEP TANTSIFTE CT AIT BLAL	457.200,00	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1er forage achevé Négatif</li> <li>• 2ème forage Positif</li> <li>• Reste essai de pompage et tête de forage</li> </ul>
2022	238/2022	TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES DOUARS RELEVANT DES COMMUNES TERRITORIALES TAGLEFT, OUAOUIZERTH ET AGOUDI N'LKHIR	2.002.104,00	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ct agoudi n'elkher: reste réservoirs</li> <li>▪ Ct Tagleft: DR Boutghighacht achevé</li> <li>▪ CT Ouaouizeght: Plans non transmit par l'ONEE</li> </ul>
2022	208/2022	TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DES DOUARS ASSENTIK-ICOUMINE- IMINTSSALMITE CT ZAOUIAT AHENSAL	2.295.720,00	-	<p>Problème de l'étude initiale</p> <p>Reprise des travaux le 10/05/2023</p>

# AUTRES PROGRAMMES

<u>N° de marché</u>	<u>Objet</u>	<u>Montant</u>	<u>Observations</u>
<b>Provinces de Béni Mellal &amp; Azilal</b>			
<b>159/2022</b>	<b>Travaux de réalisation des forages (reconnaissance et exploitation) aux différentes communes des provinces Azilal et BM <u>Ouaouizeght, Rfala</u></b>	<b>2.607.600,00</b>	<b>Partie Azilal achevée</b>

# CV 220 AZILAL

<u>N° de marché</u>	<u>Objet</u>	<u>Montant</u>	<u>Observations</u>
<b>Programme CV220 (2018)</b>			
AO68/2023	Travaux d'adduction en eau potable des douars Afouzar, Tafouzart, Ait Bram, Suit Ait Hmad, et Aganane à la CT de Ait Mhamed	2.086.056,00	OP le 10/05/2023
190/2021	Travaux d'AEP des douars CHAOUR, Ait BRAM, et TADAOUT NBOUSSETTA relevant de la CT Ait Mhamed	6.256.380,00	Travaux Achevés
AO 149/2022	TRAVAUX D ADDUCTION EN EAU POTABLE DU DOUAR TINKEST RELEVANT DE LA CT AIT MHAMED	3.384.816,00	En cours d'approbation
<b>Programme CV220 (2019)</b>			
AO 53/2023	TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES DOUARS RELEVANT DE LA COMMUNE TERRITORIALE TILOUGUIT- PROVINCE D'AZILAL; LOT : FORAGE	787.080,00	En cours d'approbation
	TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES DOUARS RELEVANT DE LA COMMUNE TERRITORIALE TILOUGUIT- PROVINCE D'AZILAL; LOT : système d'eau réseau de distribution et extension	5.391.337,20	Lot Forage approuvé le 08/05/23
61/2021	Travaux d'AEP des douars relevant des CT Tifni et Sidi Boukhlef	2.982.794,00	Avancement 95%
<b>Programme CV220 (2020)</b>			
AO 213/2022	Travaux d'AEP des douars relevant des CT Ouaozert; Tamda Noumercid et Agoudi Nikhir	4.437.360,00	En cours d'approbation
43/2023	TRAVAUX D'AEP DU CENTRE D AIT OUKABLI	5.722.662,00	Commencent 04/05/2023
DAO 48/2023	TRAVAUX D'AEP PAR BRANCHEMENTS INDIVIDUELS DES DOUARS RELEVANT DE LA CT BENI HASSAN-GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS	3.544.116,96	8 jours
DAO 79/2022	TRAVAUX D'AEP PAR BRANCHEMENTS INDIVIDUELS DES DOUARS RELEVANT DE LA CT BENI HASSAN-CONDUITES	5.347.674,00	8 jours

# MAN 3 ÈME TRANCHE

<u>N° LOT</u>	CENTRE	MONTANT	OBSERVATIONS
LOT 1	AFOURER	23.563.381,00	OP :31/05/2023
	MOULAY AISSA BEN DRISS	25.809.927,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>49.373.308,00</b>	
LOT 2	FONTAINE AFOURER	4.000.000,00	8 Jours
	<b>TOTAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	
LOT 3	TAOUNZA	8.000.000,00	8 Jours
	AIT MAJDEN	4.967.132,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>12.967.132,00</b>	
LOT 4	OUAOULA	8.500.000,00	DCE en cours de préparation pour 8 jours
	TABIA	3.887.607,00	
	BNI HASSAN	4.265.648,00	
	RFALA	3.149.309,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>19.802.564,00</b>	

# MAN 3 ÉME TRANCHE

<b><u>N° LOT</u></b>	<b>CENTRE</b>	<b>MONTANT</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
<b>LOT 5</b>	TANANT	20.000.000,00	<b>Etude en cours</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>LOT 6</b>	AIT BOUOULLI	5.500.000,00	<b>Etude en cours rectification suite aux recommandations du 05/05</b>
	AIT BLAL	4.872.403,00	<b>Etude disponible</b>
	SIDI BOULKHLEF	10.093.006,00	<b>Etude nécessite l'actualisation</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20.465.409,00</b>	
<b>LOT 7</b>	TAMDA NOUMERCIDE	8.000.000,00	<b>Etude disponible</b>
	TABANT	12.000.000,00	<b>Etude nécessite l'actualisation</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	

# MAN 3 ÈME TRANCHE

<b>N° LOT</b>	<b>CENTRE</b>	<b>MONTANT</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
<b>LOT 8</b>	ANZOU	8.127.184,00	<b>Etude disponible</b>
	TIFNI	4.597.535,00	<b>Étude technique reçue le 08/05/2023</b>
	SIDI YACOUB	7.035.232,00	<b>Étude technique en cours par la CT</b>
	AIT OUMDISS	4.740.615,00	<b>Etude disponible</b>
	TIDILI FETOUAKA	5.780.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>30.280.566,00</b>	
<b>LOT 9</b>	AIT OUAARDA	4.715.155,00	<b>Étude technique en cours par la CT</b>
	TISQUI	3.696.419,00	<b>Etude disponible</b>
	AIT MAZIGH	5.070.027,00	<b>Etude nécessite l'actualisation</b>
	ISSEKSSI	4.929.420,00	<b>Etude disponible</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18.411.021,00</b>	
	BINE EL OUIDANE	28.524.770,40	<b>travaux en cours</b>
<b>TOTAL PROVINCE AZILAL 3EME TRANCHE (TTC)</b>		<b>223.824.770,40</b>	

# ZONE D'ACTIVITE

N° DAO	Objet d'AO	Estimation TTC	Attributaire	Montant marché TTC	ETAPE
20-2023	TRAVAUX DE CREATION D'UNE ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE À DEMNATE ET UNE ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE A AZILAL - PROVINCE D'AZILAL-LOT VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE	16.890.567,00	GR AGOUDI DAYS ET SICATRA	16.391.598,00	APPROBATION/VISA
61-2023	TRAVAUX DE CREATION D'UNE ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE À DEMNATE ET UNE ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE A AZILAL - PROVINCE D'AZILAL-LOT ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC	13.678.502,69			OP :07/06/2023
